




Rubius Project Manager

Система управления проектами

Статистика реализации проектов*

- Только 44% проектов реализуются в срок и в рамках бюджета
- Среднее превышение бюджета 189%
- Среднее превышение сроков 222%
- 70% проектов сокращают запланированный объём работ
- 30% проектов закрываются досрочно

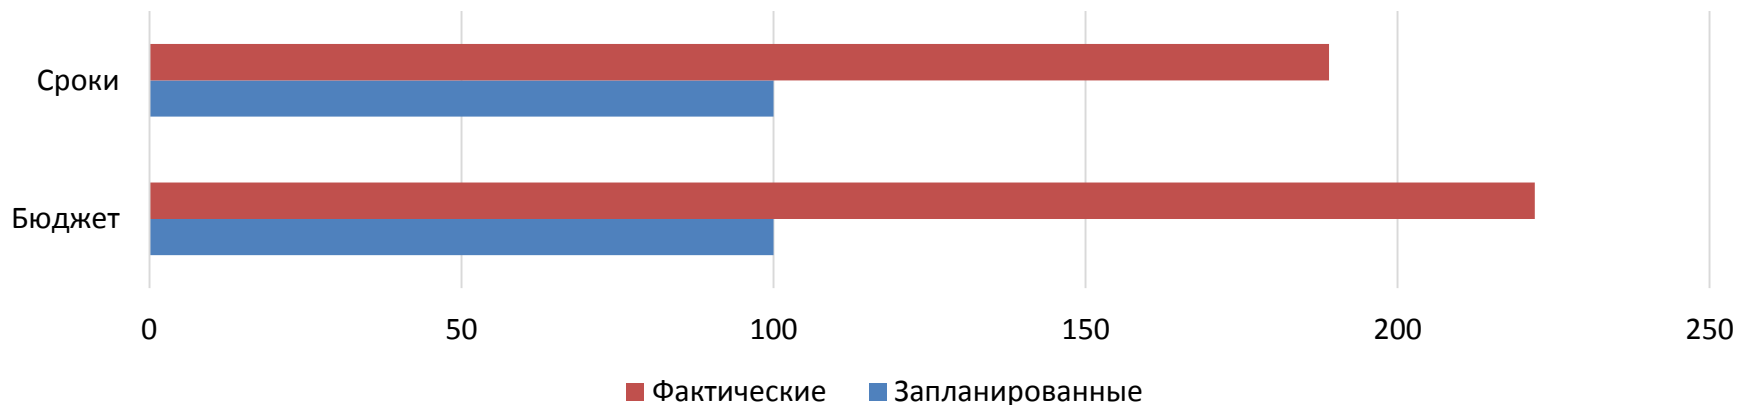

* согласно исследованию 50 000 завершённых проектов, проведённого Standish Group

Жизненный цикл проекта

Проект – временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов или услуг (PMBOOK)



Задачи системы управления проектами

1. Планирование

- Сетевое планирование, назначение ресурсов
- Планирование стоимости проекта
- Календарное планирование

2. Исполнение

- Формирование заданий исполнителям
- Отчётность о ходе выполнения работ

3. Мониторинг и контроль

- Отслеживание фактических сроков и трудозатрат
- Визуализация процесса выполнения работ

4. Управление

- Калькуляция плана на текущую дату
- Корректировка плана

5. Завершение проекта

- Формирование отчётов
- Архивирование проекта для накопления статистики и использования полученного опыта

Сетевое планирование

- Структура декомпозиции работ (СДР)
- Порядок следования работ проекта
- Длительности каждой работы и всего проекта
- Критические работы проекта и его критический путь
- Справочник типовых работ предприятия
- Вложение планов в виде задач
- Назначение прав доступа на задачи

Номер	Задача	Трудозатраты	Начало	Окончание	Длительность	Ресурсы
1	▼ Марка ГП	8 ч	19.08.2014	19.08.2014	1 день	Кошевой С.Е.
2	Разработка цифровой модели местности	8 ч	19.08.2014	19.08.2014	1 день	Говоров А.А.
3	▼ Формирование чертежей	117 ч	20.08.2014	09.09.2014	14,63 дня	Кошевой С.Е.
4	Ситуационный план	29 ч	20.08.2014	25.08.2014	3,63 дня	Абрамов А.О.
5	План монтажных проездов	24 ч	25.08.2014	28.08.2014	3 дня	Деревяшкин М.В.
6	Разбивочный план	8 ч	28.08.2014	29.08.2014	1 день	Мурыгин М.С.
7	Конструкция дорожной одежды	16 ч	29.08.2014	02.09.2014	2 дня	Новосельцев И.А.
8	План организации рельефа	16 ч	02.09.2014	04.09.2014	2 дня	Перфильев А.В.
9	Сводный план сетей	24 ч	04.09.2014	09.09.2014	3 дня	Тимошенко Е.А.

Назначение ресурсов

- Назначение сотрудников и отделов
- Учёт загрузки ресурсов по всем проектам
- Отслеживание перегрузки ресурсов
- Календарь ресурса
- Ответственные за выполнение плана и отдельных задач
- Резервирование ресурсов под планируемые задачи

Имя	Общее время	Число задач	Отдел	Должность	августа							С 11 августа			С 18 августа			С 25 августа				С 01 сентября				С 0										
					Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср					
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
Rubius Group	0 ч	0																																		
▼ Rubius	463 ч	57																																		
Говоров А.А.	8 ч	1	Rubius	Менеджер																																
Абрамов А.О.	55 ч	9	Rubius	Разработчик																																
Деревяшкин М.В.	111 ч	12	Rubius	Разработчик																																
Кошевой С.Е.	0 ч	0	Rubius	Менеджер																																
Мурыгин М.С.	204 ч	26	Rubius	Разработчик																																
Новосельцев И.А.	31 ч	6	Rubius	Менеджер																																
Перфильев А.В.	16 ч	1	Rubius																																	
Тимошенко Е.А.	38 ч	2	Rubius																																	
Иванов И.И.	0 ч	0	Rubius																																	
					Рабочий день (8 ч)																															
					Общее время: 8 ч																															
					Дата: 01.09.2014																															
					План: Новореченская ТЭЦ Задача: Конструкция дорожной одежды Время: 8 ч Ресурс: Новосельцев И.А.																															

Планирование стоимости проекта

- Ставка сотрудника
- Стоимость отдельных групп работ
- Планируемая и фактическая стоимость задач и планов
- Формирование отчётов о стоимости проектов и задач
- Расчёт расходов за заданный промежуток времени

Номер	Задача	Ресурсы	Стоимость
1	▼ Марка ГП	Кошевой С.Е.	6 400
2	Разработка цифровой модели местности	Говоров А.А.	6 400
3	▼ Формирование чертежей	Кошевой С.Е.	93 600
4	Ситуационный план	Абрамов А.О.	23 200
5	План монтажных проездов	Деревяшкин М.В.	19 200
6	Разбивочный план	Мурыгин М.С.	6 400
7	Конструкция дорожной одежды	Новосельцев И.А.	12 800
8	План организации рельефа	Перфильев А.В.	12 800
9	Сводный план сетей	Тимошенко Е.А.	19 200
10	▼ Отчёты	Кошевой С.Е.	17 600
11	Ведомость объемов работ	Новосельцев И.А.	6 400
12	Составление сметы	Тимошенко Е.А.	11 200

Настройки ресурсов

Общие Календари

Имя ресурса: Говоров А.А.

Ставка: 800


Использовать индивидуальный календарь

OK Отмена

Rubius Group
▲ Rubius
Говоров А.А.
Абрамов А.О.
Деревяшкин М.В.
Кошевой С.Е.
Мурыгин М.С.
Новосельцев И.А.
Перфильев А.В.
Тимошенко Е.А.
Иванов И.И.

Календарное планирование

- Календарные сроки работ
- Календари предприятия, отделов, ресурсов, планов
- Распределение запланированных затрат во времени
- Учёт работ с фиксированными длительностью, трудозатратами
- Фиксирование сроков начала и окончания работ

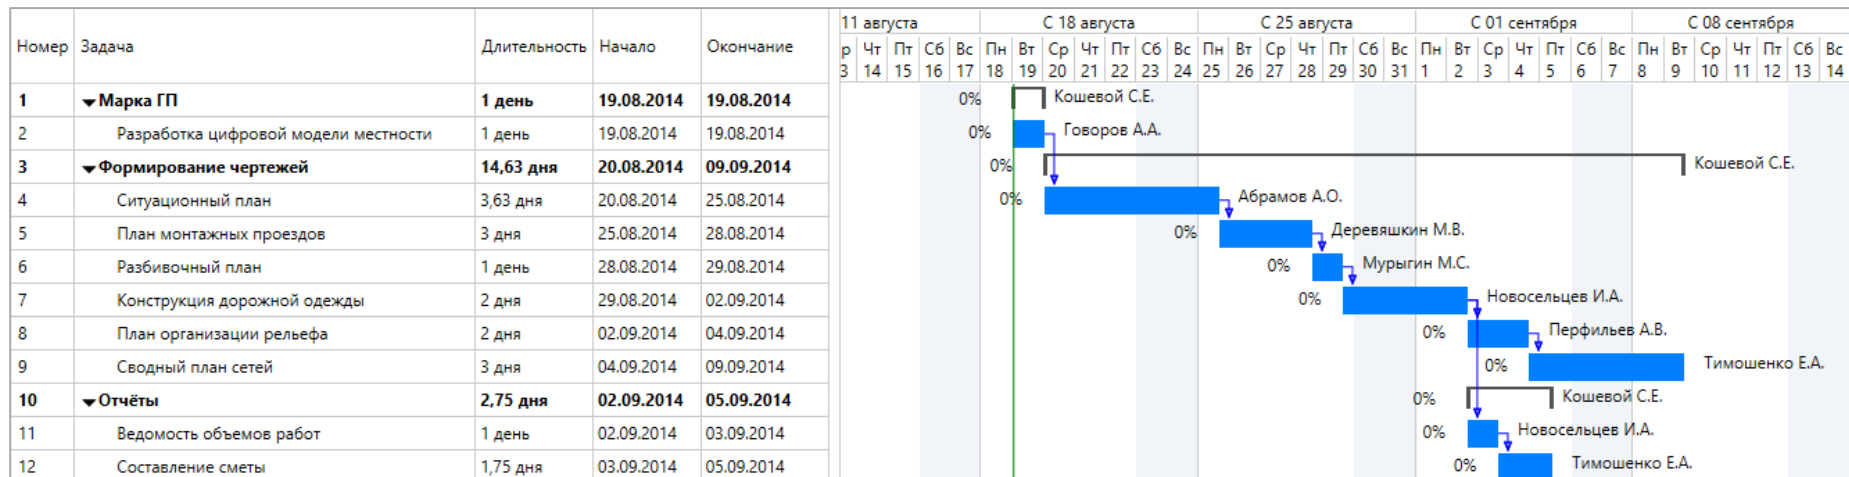

Исполнение

- Формирование заданий исполнителям
- Вложение файлов в задания
- Отчётность о ходе выполнения работ
- Переписка по заданию

Номер	Задача	Ресурсы
1	▼ Марка ГП	Кошевой С.Е.
2	Разработка цифровой модели местнос	Говоров А.А.
3	▼ Формирование чертежей	Кошевой С.Е.
4	♥ Ситуационный план	Иванов И.И.
5	▶ План монтажных проездов	Иванов И.И.
6	▶ Разбивочный план	Иванов И.И.
7	↔ Конструкция дорожной одежды	Иванов И.И.
8	План организации рельефа	Перфильев А.В.
9	Сводный план сетей	Тимошенко Е.А.
10	▼ Отчёты	Кошевой С.Е.
11	Ведомость объемов работ	Новосельцев И.А.
12	■ Составление сметы	Петров П.С.

Журнал задания

Задание: Ситуационный план



Планируемые трудозатраты: 29 ч Фактические трудозатраты: 12 ч Процент выполнения: 41 %

Дата	Трудозатраты	Выполнение	Комментарий
20.08.2014	2 ч	7 %	Настройка проекта
20.08.2014	10 ч	34 %	Разработка плана

Сохранить Отменить


Мониторинг и контроль

- Отслеживание фактических сроков и трудозатрат
- Визуализация процесса выполнения работ
- Отслеживание промежуточных итогов выполнения заданий
- План-фактный анализ текущей ситуации

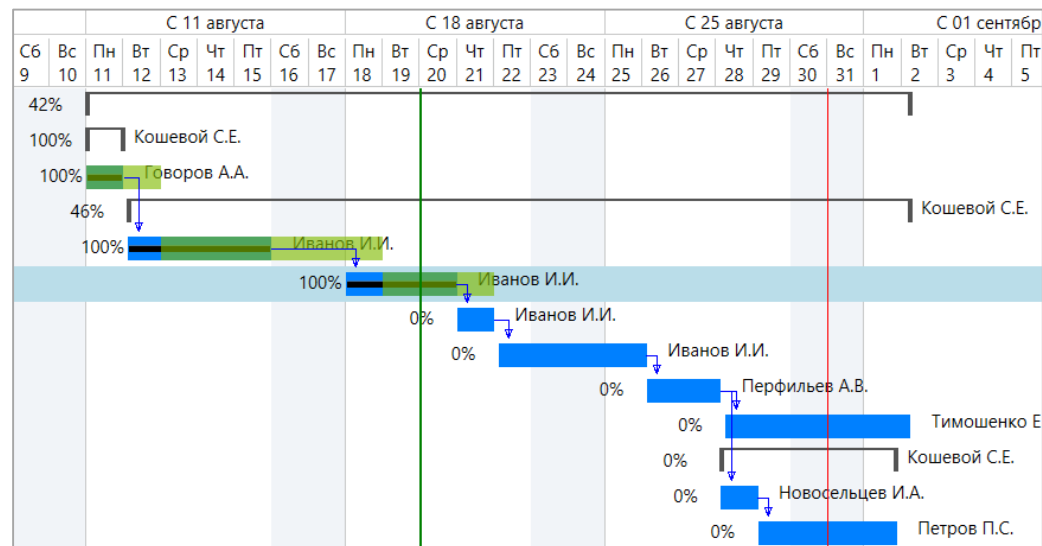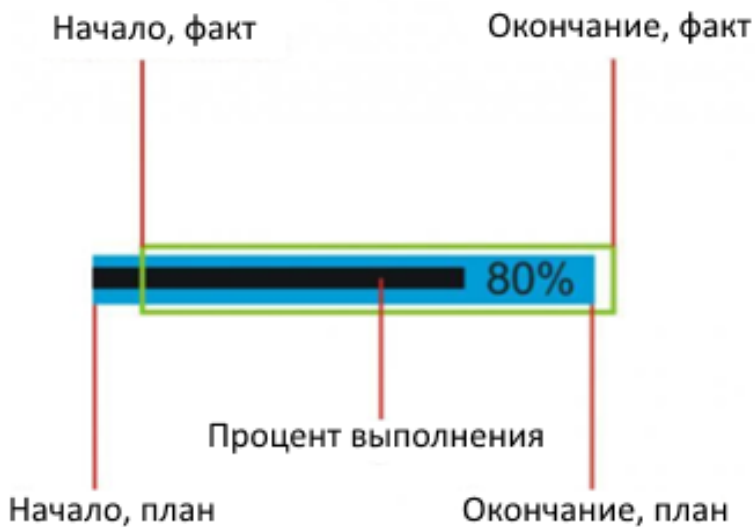


Мониторинг и контроль

- Сводная информация по всему портфелю проектов
- Визуализация в виде диаграмм, графиков и таблиц
- Быстрый переход к «проблемным» проектам и задачам
- Анализ информации за неделю, месяц, квартал или год

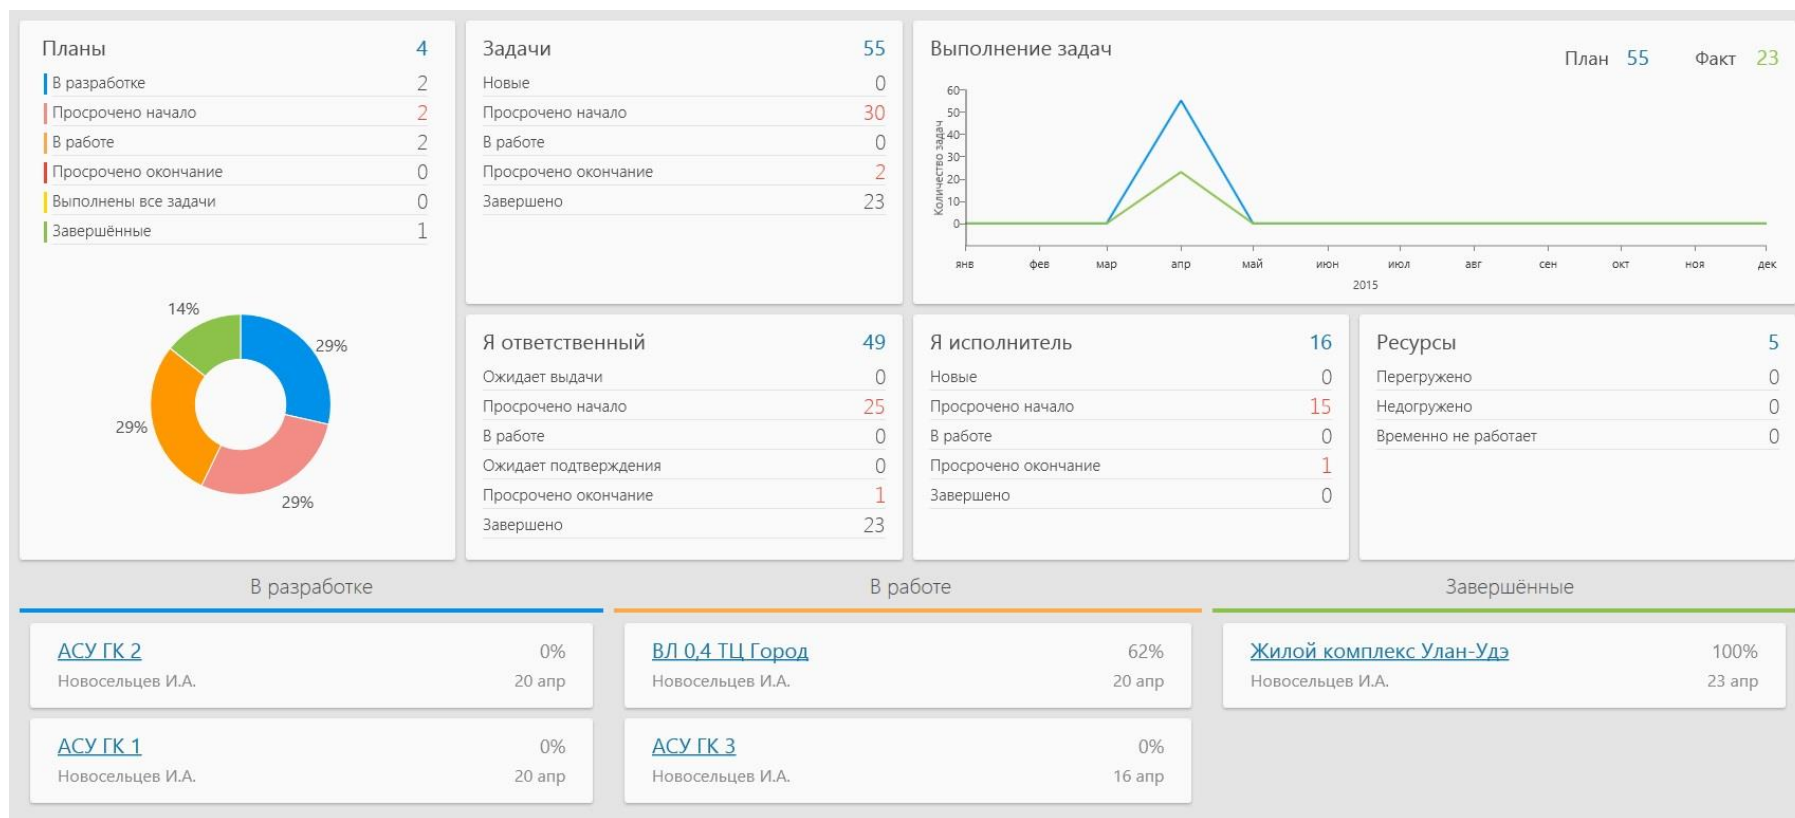

Управление

- Калькуляция проекта на текущую дату
- Перепланирование проекта
- Сохранение базового плана

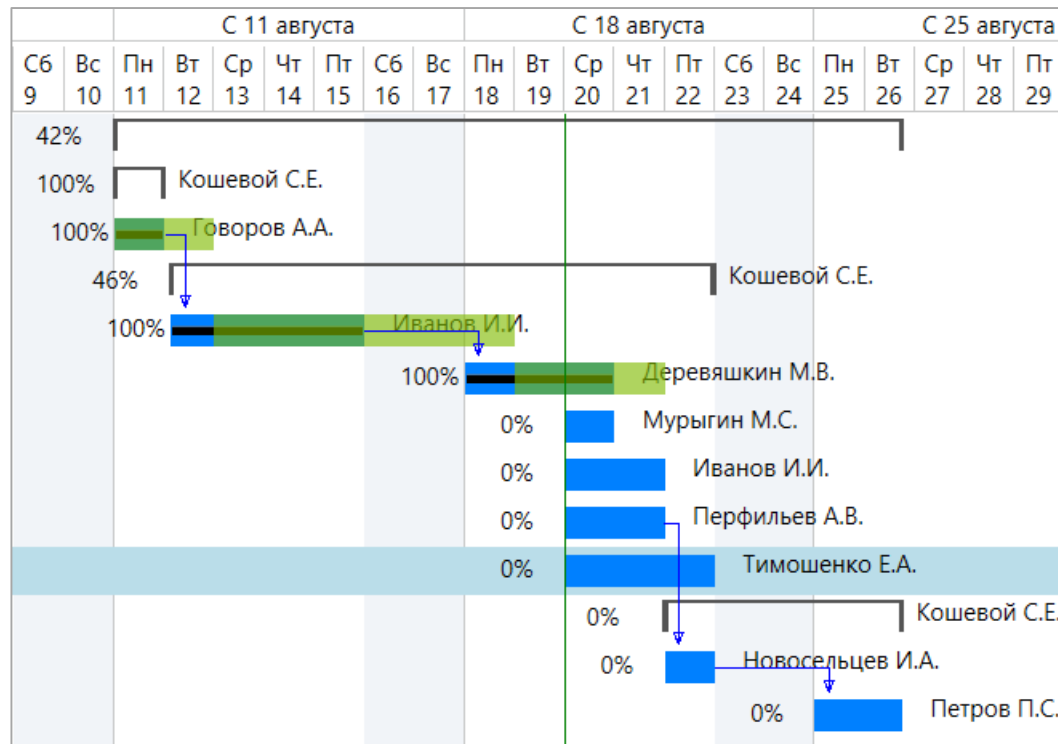

Завершение проекта

- Формирование отчётов в форматах Word и Excel:
 - О состоянии выполнения проекта или группы проектов
 - Задействованности ресурсов в исполнении проектов
 - Индивидуальных отчётов по каждому сотруднику
- Сохранение планов в архиве
- Экспорт в MS Project

Отчёт по плану

Режим построения отчёта

Все работы

Работы на указанную дату

Выполненные работы

Просроченные работы

Статистика плана

Работы для ресурса

Настройки

Дата: 29.08.2014

Открыть отчёт после создания

Создать Отменить

Без проекта. Все работы - Excel

Задача	Трудозатраты	Начало	Окончание	Длительность	Выполнение	Ресурсы
Марше ПП	8 ч	11.08.14	11.08.14	1 день	100%	Кошевой С.Е.
Разработка цифровой модели местности	8 ч	11.08.14	11.08.14	1 день	100%	Говоров А.А.
чертежей	119 ч	12.08.14	22.08.14	8,88 дня	46%	Кошевой С.Е.
Ситуационный план проездов	31 ч	12.08.14	15.08.14	3,88 дня	100%	Иванов И.И.
Разбивочный план	8 ч	20.08.14	20.08.14	1 день	0%	Мурзин М.С.
одежды	16 ч	20.08.14	21.08.14	2 дня	0%	Иванов И.И.
рельефа	16 ч	20.08.14	21.08.14	2 дня	0%	Перфильев А.В.
Сводный план сетей	24 ч	20.08.14	22.08.14	3 дня	0%	Тимошенко Е.А.
Отчеты работ	22 ч	22.08.14	26.08.14	2,75 дня	0%	Кошевой С.Е.
Составление сметы	8 ч	22.08.14	22.08.14	1 день	0%	Новосельцев И.А.
	14 ч	25.08.14	26.08.14	1,75 дня	0%	Петров П.С.


Sheet1

Без проекта. Все работы [Сохра...

Имя	Имя	Прогнозиру	Исполн	Сроки	Длительность	Выполнение	Ресурсы	Сметная	Фактически	Фактически
1	Марше ПП	8 ч	11.08.14	11.08.14	1 день	100%	Кошевой С.Е.	8000		
2	Разработка цифровой модели местности	8 ч	11.08.14	11.08.14	1 день	100%	Говоров А.А.	8000	11.08.14	12.08.14
3	Ситуационный план проездов	31 ч	12.08.14	15.08.14	3,88 дня	46%	Иванов И.И.	95200		
4	Ситуационный план разбивочный	31 ч	12.08.14	15.08.14	3,88 дня	100%	Иванов И.И.	24800	12.08.14	15.08.14
5	Разбивочный план	24 ч	18.08.14	20.08.14	3 дня	100%	Деревяшкин М.В.	18200	18.08.14	21.08.14
6	Разбивочный план одежды	8 ч	20.08.14	20.08.14	1 день	0%	Мурзин М.С.	8000		
7	Разбивочный план рельефа	16 ч	20.08.14	21.08.14	2 дня	0%	Иванов И.И.	12800		
8	Разбивочный план Сводный план сетей	16 ч	20.08.14	21.08.14	2 дня	0%	Перфильев А.В.	12800		
9	Отчеты работ	22 ч	22.08.14	22.08.14	3 дня	0%	Тимошенко Е.А.	18200		
10	Составление сметы	22 ч	22.08.14	26.08.14	2,75 дня	0%	Кошевой С.Е.	8000		
11	Фактически	8 ч	22.08.14	22.08.14	1 день	0%	Новосельцев И.А.	8000		
12	Составление сметы	14 ч	25.08.14	26.08.14	1,75 дня	0%	Петров П.С.	0		

PAGE 1 OF 1 219 WORDS 80%

Интеграция с СЭД*



* – система электронного документооборота

Rubius Project Manager используют



Башкиргражданпроект

СИБЭКС



Ключевые возможности RPM

- Структурное, сетевое и календарное планирование
- Планирование стоимости проекта
- Отслеживание и визуализация процесса выполнения работ
- План-фактный анализ и корректировка плана
- Коллективная работа над планом
- Работа по всему портфелю проектов предприятия
- Интеграция с СЭД
- Построение отчётов
- Экспорт данных в MS Project



Приглашаем
к сотрудничеству

www.rubius.com

info@rubius.com

+7 (3822) 9-7777-2
